若松第3排水区雨水管布設工事(3工区)の施工について

請負業者:津川興業 株式会社

## 1. 施 工 内 容 に つ い て



#### 施工手順

準備工:舗装切断

架空線防護工(東電·NTT等)

現場施設設置 (仮設電気等)

本体工事:本工事では、道路規制(車両通行止)等に よる影響を極力少なくするために、施工範囲 を左図のように3施工で分けております。

鋼矢板圧入引抜工: 3 施工


管渠工(掘削~埋戻し):3施工

付帯工事:仮排水管切回し工

仮排水管布設工

舗装復旧工

### 2. 交通規制予定図

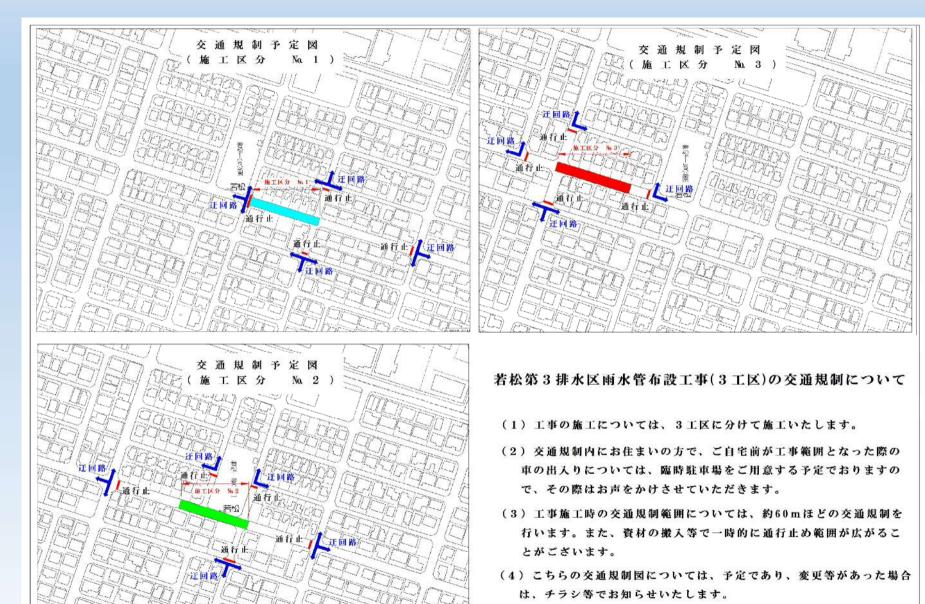


# 3. 安全対策について

### 安全対策

作業時における歩行者等の安全確保の為、以下の体系で行います。 なお、開口部周辺は転落等の防止のため、安全策等を設置します。

作業体系

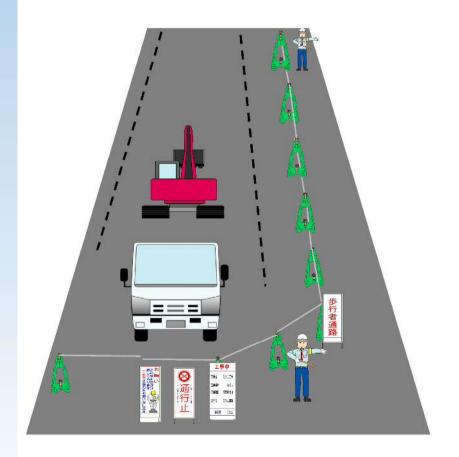

#### 開口部周辺



